


муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 271»

«Оптимизация процесса выдачи методической литературы в МБДОУ «Детский сад № 271»

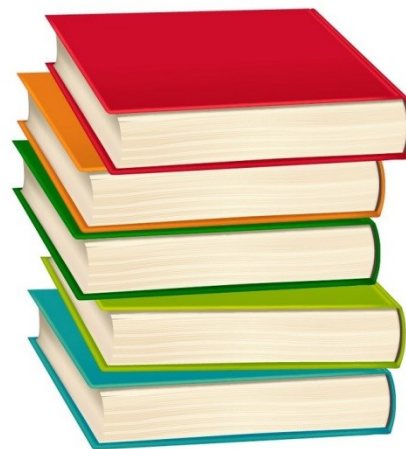

г. Нижний Новгород
январь – май 2020 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса выдачи методической литературы в МБДОУ «Детский сад № 271»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса – старший воспитатель, воспитатели;
Периметр проекта – методический кабинет, групповые помещения, кабинет инструктора по физической культуре и музыкального руководителя;
Владелец проекта – заведующий Абросимова А.Д.;
Руководитель проекта – старший воспитатель Некрасова К.А.;
Команда проекта – старший воспитатель Некрасова К.А., заведующий хозяйством Погоняева В.В., воспитатель Сычева Т.В.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – неудовлетворенность заказчиков длительным поиском нужной методической литературы.

Проблемы:

1. Потери:
 - 1.1. ожидание (временные затраты определение местонахождения нужного издания по Журналу выдачи методической литературы);
 - 1.2. лишние движения (заполнение Журналов учёта методической литературы и выдачи методической литературы; перемещения по помещениям с целью поиска литературы);
2. Затруднения в получении выборки литературы по заданным критериям

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на поиск и выдачу методической литературы	10,5 – 68 минут	1,25 – 16 минут
Возможность получения выборки литературы по заданным критериям		

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 22.01.2020;
2. Диагностика и целевое состояние – 22.01.2020 - 05.02.2020
Разработка текущей карты процесса – 22.01.2020 – 29.01.2020;
Разработка целевой карты процесса – 30.01.2020 – 05.02.2020
3. Внедрение улучшений – 06.02.2020 - 21.04.2020;
 - Совещание по защите подходов внедрения – 21.04.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 22.04.2020-11.05.2020
 - Завершающее совещание – 11.05.2020
5. Постпроектный мониторинг – периодически


ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
	ожидание (временные затраты определение местонахождения нужного издания по Журналу выдачи методической литературы)	Использование бумажных форм Журналов учёта методической литературы и выдачи методической литературы	Использование программы LibaBook
	лишние движения (заполнение Журналов учёта методической литературы и выдачи методической литературы; перемещения по помещениям с целью поиска литературы)	Использование бумажных форм Журналов учёта методической литературы и выдачи методической литературы	Использование программы LibaBook
	затруднения в получении выборки литературы по заданным критериям	Отсутствие электронного каталогизатора	Использование программы LibaBook

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Формирование команды проекта	22.01.2020	Сформирована команда из администрации, педагогического и административно-технического персонала	Заведующий
2	Выявление проблем, поиск их решения	22.01.2020 – 05.02.2020	Разработка текущей карты процесса и целевой карты процесса	Старший воспитатель
3	Установка программного обеспечения	05.02.2020	На компьютере в методическом кабинете установлена программа LibaBook	Старший воспитатель
4	Заполнение электронного каталога	06.02.2020 – 02.03.2020	В базу внесены все печатные издания для реализации ООП	Старший воспитатель
5	Заполнение личных карточек читателей (педагогов)	03.03.2020	Для каждого педагога создан личный кабинет читателя	Старший воспитатель
6	Внедрение улучшений	06.02.2020 – 21.04.2020	Значительное сокращение времени на поиск и выдачу методической литературы Возможность получения выборки литературы по заданным критериям	Старший воспитатель
6	Завершение проекта	22.04.2020 – 11.05.2020	Отказ от бумажной версии журналов учета и выдачи методической литературы	Старший воспитатель, педагоги

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




ВПП = 10,5 - 68 мин


ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ




Поиск нужной
книги
затруднен



Требуется много
времени на
заполнение
журналов учета



ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

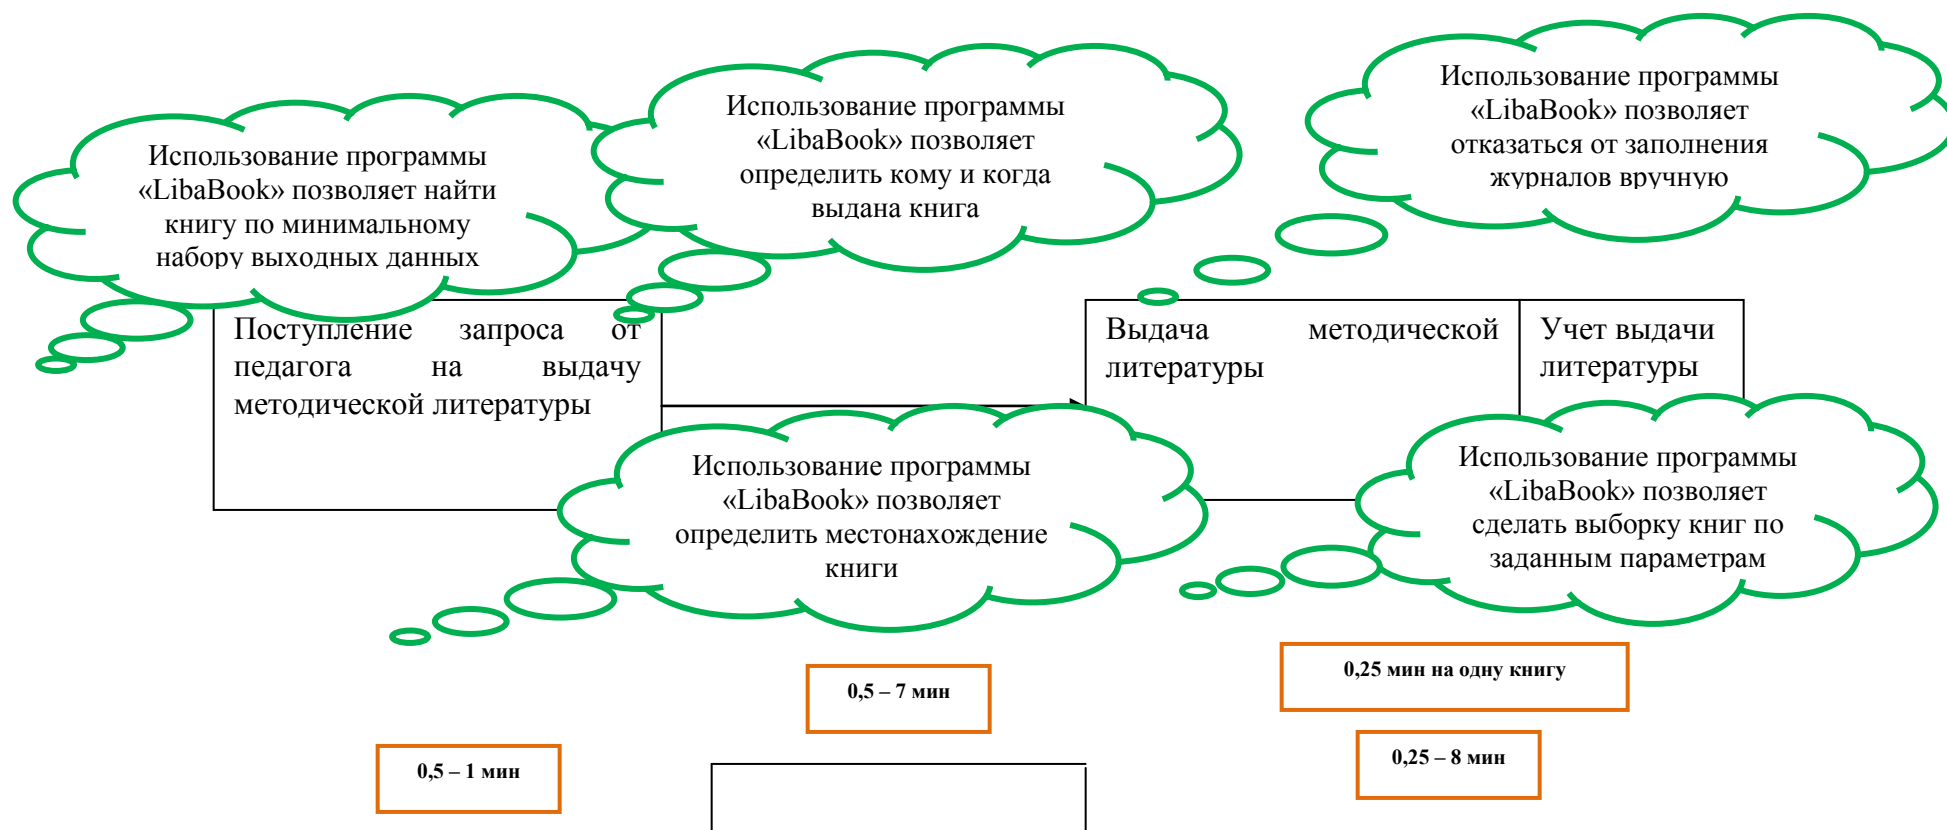

**ЦЕЛЕВОЕ ВПШ =
1,25 - 16 мин**

